Рекомендуемый образец — приложение № 3 к Составу исполнительной документации, утверждённому приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр
(применяется с 01.09.2023; формы носят рекомендательный характер — письмо Минстроя России от 29.09.2025 № 27109-ОГ/08)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№ 1 «___» _____ 20 26 г.
(дата составления акта)

Объект капитального строительства *Ограждение территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № __» по адресу: [адрес объекта] (изготовление и монтаж ограждения)*
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор *[Заказчик по договору: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, телефон]*
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс; наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт *[Ваша организация (подрядчик): наименование, ОГРН, ИНН, адрес, телефон; СРО — при необходимости]*
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс; наименование, ОГРН, ИНН СРО, членом которой является (за исключением случаев, когда членство в СРО не требуется))

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации *[Проектировщик — если проект есть; при работе по смете без проекта — «не привлекался»]*
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон/факс; СРО)

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля *[должность, фамилия, инициалы; идентификационный номер в НРС — при наличии; реквизиты приказа о полномочиях] — например: директор МБОУ «СОШ № __» [Ф. И. О.], приказ от [__] № [__]*
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт *[должность, фамилия, инициалы] — например: производитель работ [Ф. И. О.], приказ от [__] № [__]*
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) *[должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в НРС, приказ о назначении ответственного за строительный контроль]*
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации *[заполняется при осуществлении авторского надзора; иначе — «не привлекался»]*
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию *[заполняется, если работы выполнял субподрядчик по договору с подрядчиком; при выполнении собственными силами — не заполняется]*
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица)

произвели осмотр работ, выполненных *[Ваша организация (подрядчик)]*
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Устройство фундаментов под стойки ограждения: бурение скважин Ø 250 мм глубиной 1,2 м по оси ограждения, установка стоек из трубы профильной 60×60×3 мм (ГОСТ 30245-2012, сталь С245) с выверкой по вертикали и в створе, бетонирование скважин бетоном класса В15 (М200), W4, F100 — [количество стоек по смете] шт., участок ограждения от стойки С-1 до стойки С-[__] (оси по исполнительной схеме № 1)
(наименование скрытых работ)

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN

2. Работы выполнены по проектной документации Локальный сметный расчёт № [__] «Изготовление и монтаж ограждения территории школы» (приложение к договору от [__] № [__]); схема ограждения (план расстановки стоек) — лист [__]; при наличии проекта — шифр [__], разработчик [__]

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены труба стальная профильная квадратная 60×60×3 мм ГОСТ 30245-2012, сталь С245 ГОСТ 27772-2021 — сертификат качества № [__] от [__]; бетонная смесь БСГ В15 П3 F100 W4 ГОСТ 7473-2010 — документ о качестве (паспорт) № [__] от [__], протокол испытаний бетона на сжатие № [__]; грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 — паспорт № [__]; эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 — паспорт № [__]

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность; при более чем 5 документах — ссылка на реестр, являющийся неотъемлемой частью акта)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям исполнительная схема № 1 «Расположение стоек ограждения в плане» от [__] (прилагается); общий журнал работ № 1 (записи за [даты работ]); журнал бетонных работ (записи за [даты]); протокол испытаний контрольных образцов бетона № [__] от [__]

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ «__» _____ 2026 г.; окончания работ «__» _____ 2026 г.

6. Работы выполнены в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 7, 11); СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (раздел 4 — монтаж стальных конструкций, раздел 5 — бетонные работы); СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (раздел 6); СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; локальным сметным расчётом № [__] и схемой ограждения лист [__]

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ монтаж секций ограждения (рамы из профильной трубы 40×20×2 мм с заполнением по смете), ворот и калиток на стойки — после набора бетоном не менее 70 % проектной прочности; антикоррозионная окраска конструкций

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения отклонения стоек от проектного положения — в пределах допусков (см. исполнительную схему № 1); замечаний нет

Акт составлен в 3 **экземплярах** (в случае заполнения акта на бумажном носителе — по числу подписавших).

Приложения: 1. Исполнительная схема № 1 расположения стоек ограждения — 1 л. 2. Документы о качестве материалов — [__] л. 3. Протокол испытаний бетона № [__] — [__] л.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля	[Ф. И. О.] (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт	[Ф. И. О.] (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)	[Ф. И. О.] (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)	— (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (при выполнении работ по договору с иным лицом)	— (фамилия, инициалы)	(подпись)

Порядок: акт подписывается до закрытия работ последующими; экземпляров — по числу подписантов (п. 4 Порядка ведения исполнительной документации, приложение № 2 к приказу № 344/пр); в электронном виде — УКЭП, формат xml или pdf/docx. Далее по объекту оформляются: АОСР № 2 «Монтаж секций ограждения, ворот и калиток», АОСР № 3 «Антикоррозионная защита металлоконструкций ограждения».

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

Унифицированная форма № КС-2 — постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100; с 2013 г. применяется по условию договора (ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ)

Инвестор —

Заказчик (Генподрядчик) *[Заказчик по договору], ОГРН, ИНН, адрес, телефон*

Подрядчик (Субподрядчик) *[Ваша организация], ОГРН, ИНН, адрес, телефон*

Стройка *Ограждение территории МБОУ «СОШ № », [адрес]*

Объект *Ограждение территории школы (изготовление и монтаж)*

Договор подряда (контракт) *№ [ ] от [ ]; доп. соглашение № [ ] от [ ] (удорожание)*

Сметная (договорная) стоимость по договору, руб. *[из договора]*

Вид операции —

Номер документа	Дата составления	Отчётный период с	по
1	[__.__.2026]	[__.__.2026]	[__.__.2026]

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	[__]

АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ограждение территории школы (локальный сметный расчёт № [__])							
1	[№ поз. по смете]	Бурение ям (скважин) Ø 250 мм глубиной до 1,2 м под стойки ограждения	[ФЕР/ТЕР по смете]	100 шт.	[из сметы]	[из сметы]	[из сметы]
2	[№ поз.]	Установка металлических стоек ограждения из профильной трубы 60×60×3 мм с выверкой	[расценка]	т	[из сметы]	[из сметы]	[из сметы]
3	[№ поз.]	Бетонирование стоек в скважинах бетоном В15 (М200)	[расценка]	м³	[из сметы]	[из сметы]	[из сметы]
4	[№ поз.]	Изготовление секций ограждения из профильной трубы 40×20×2 мм (рама, заполнение по смете)	[расценка]	т	[из сметы]	[из сметы]	[из сметы]
5	[№ поз.]	Монтаж секций ограждения, ворот распашных и калитки	[расценка]	т / шт.	[из сметы]	[из сметы]	[из сметы]
6	[№ поз.]	Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза (ГФ-021, ПФ-115)	[расценка]	100 м²	[из сметы]	[из сметы]	[из сметы]
		Итого по разделу 1					**[из сметы]**
Раздел 2. Удорожание по дополнительной (компенсационной) смете № [__] от [__] (доп. соглашение № [__] к договору)							
7	[№ поз. доп. сметы]	Удорожание стоимости материалов (труба профильная, бетон) — расчёт по фактическим ценам поставщиков против сметных	расчёт	компл.	1	[из расчёта]	[из расчёта]
8	[№ поз. доп. сметы]	Дополнительные работы, не учтённые сметой [наименование по факту: например, демонтаж старого ограждения / вывоз грунта]	[расценка]	[ед.]	[факт]	[из расчёта]	[из расчёта]
		Итого по разделу 2 (удорожание) — по ТЗ 50 тыс. ₽					**50 000,00**
		ИТОГО по акту (раздел 1 + раздел 2)					**[__]**
		НДС 20 % / без НДС (подрядчик на УСН — указать основание) — [из договора]					[__]
		ВСЕГО по акту с учётом НДС					**[__]**

Сдал [должность] _____ [Ф. И. О.]
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) М. П.

Принял [должность] _____ [Ф. И. О.]
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) М. П.

Объёмы, цены и расценки (ФЕР/ТЕР/ГЭСН) — только из вашей локальной сметы и расчёта удорожания. Удорожание на 50 тыс. ₽ оформляется компенсационной сметой с обоснованием (счета поставщиков, мониторинг цен) и доп. соглашением к договору, затем включается отдельным разделом в КС-2 и отдельной строкой в КС-3.

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

Унифицированная форма № КС-3 — утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор —

Заказчик (Генподрядчик) *[Заказчик по договору], ОГРН, ИНН, адрес, телефон*

Подрядчик (Субподрядчик) *[Ваша организация], ОГРН, ИНН, адрес, телефон*

Стройка *Ограждение территории МБОУ «СОШ № », [адрес]*

Договор подряда (контракт) *№ [ ] от [ ]; доп. соглашение № [ ] от [ ]*

Вид операции —

Номер документа	Дата составления	Отчётный период с	по
1	[__.__.2026]	[__.__.2026]	[__.__.2026]

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	[__]

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчётный период
1	2	3	4	5	6
1	**Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ**		[__]	[__]	[__]
	в том числе:				
1.1	Ограждение территории школы — изготовление и монтаж (локальный сметный расчёт № [__]), акт КС-2 № 1 от [__], раздел 1		[из КС-2]	[из КС-2]	[из КС-2]
1.2	Удорожание по дополнительной смете № [__] (доп. соглашение № [__] от [__]), акт КС-2 № 1, раздел 2		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого		[__]	[__]	[__]
	Сумма НДС (20 %) / НДС не облагается — подрядчик применяет УСН [основание по договору]		[__]	[__]	[__]
	Всего с учётом НДС		[__]	[__]	[__]

Заказчик (Генподрядчик) [должность] _____ [Ф. И. О.]
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) М. П.

Подрядчик (Субподрядчик) [должность] _____ [Ф. И. О.]
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) М. П.

КС-3 составляется на основании КС-2 нарастающим итогом; графа «с начала года» и «за отчётный период» при одном акте совпадают. Удорожание показывается отдельной строкой со ссылкой на дополнительное соглашение — так заказчику проще согласовать и оплатить сверх первоначальной цены договора.

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

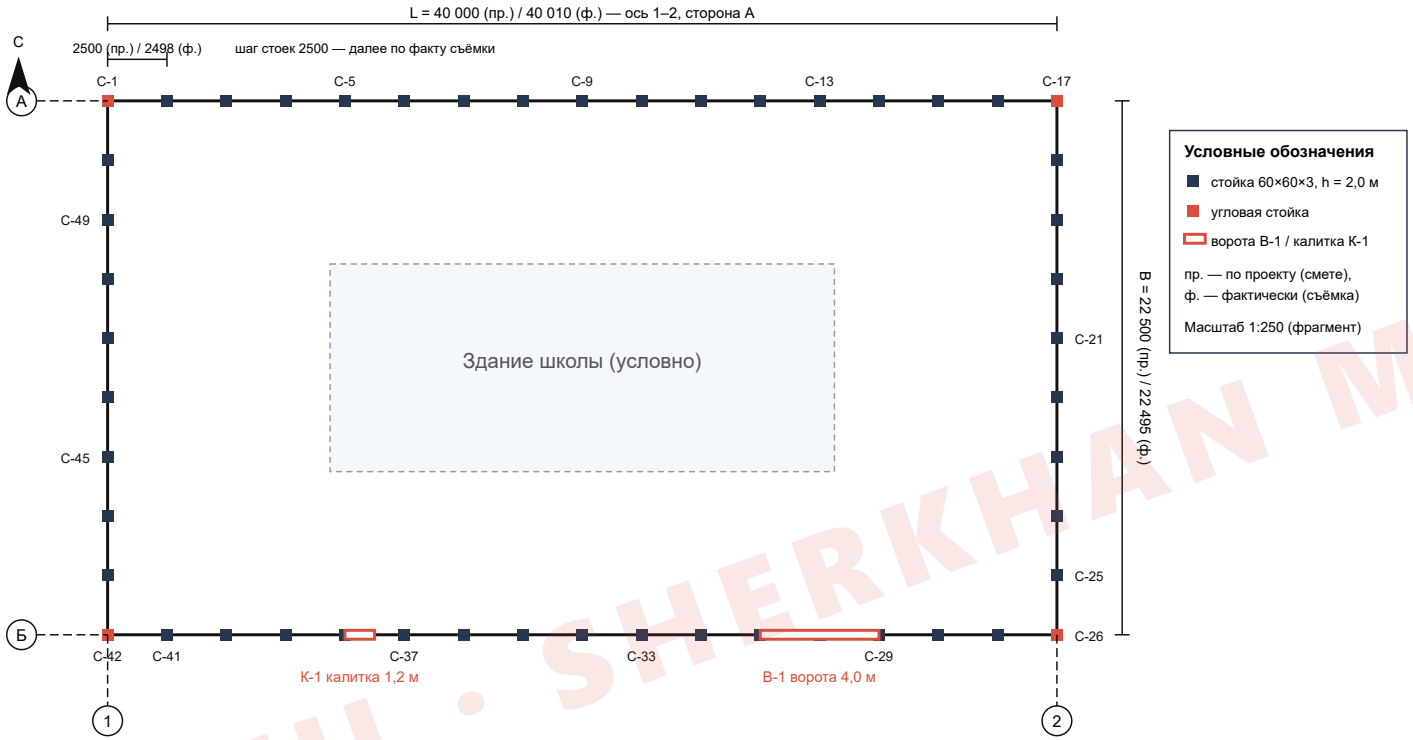

Примечания. 1. Схема составлена по результатам исполнительной геодезической съёмки после бетонирования стоек; размеры на схеме — условные, проставляются по фактическим замерам (рулетка / нивелир / тахеометр). 2. Отклонения от проектного (сметного) положения в пределах допусков; отступлений, требующих согласования с заказчиком, нет. 3. Нумерация стоек С-1…С-[n] по часовой стрелке от угловой стойки на оси 1/А. 4. Схема является приложением к акту освидетельствования скрытых работ № 1.

Контролируемые параметры			
Параметр	Пр.	Ф. (съёмка)	Допуск
Шаг стоек, мм	2500	2497–2503	±10
Отклонение стойки от вертикали, мм	0	≤ 3	5 на 2 м
Глубина заделки стойки, мм	1200	1200–1215	−0 / +50
Отклонение от створа, мм	0	≤ 5	±10
Высота ограждения, мм	2000	1998–2004	±10
допуски — по проекту / договору; значения графы «Ф.» — условные			

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА № 1. Ограждение территории МБОУ «СОШ № __», [адрес]. Расположение стоек ограждения в плане. Приложение к АОСР № 1			
Подрядчик	[Ваша организация]		
Заказчик	[Заказчик по договору]		
Составил (геодезист)	[Ф. И. О.]	подпись _____	дата [__]
Проверил (стройконтроль подрядчика)	[Ф. И. О.]	подпись _____	дата [__]
Принял (представитель заказчика)	[Ф. И. О.]	подпись _____	дата [__]
Стадия / лист	ИД	Лист 1	Листов 1

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM
